


# Beslutsunderlag Styrelse

## Nytt Lampförråd Teknik & Säkerhet

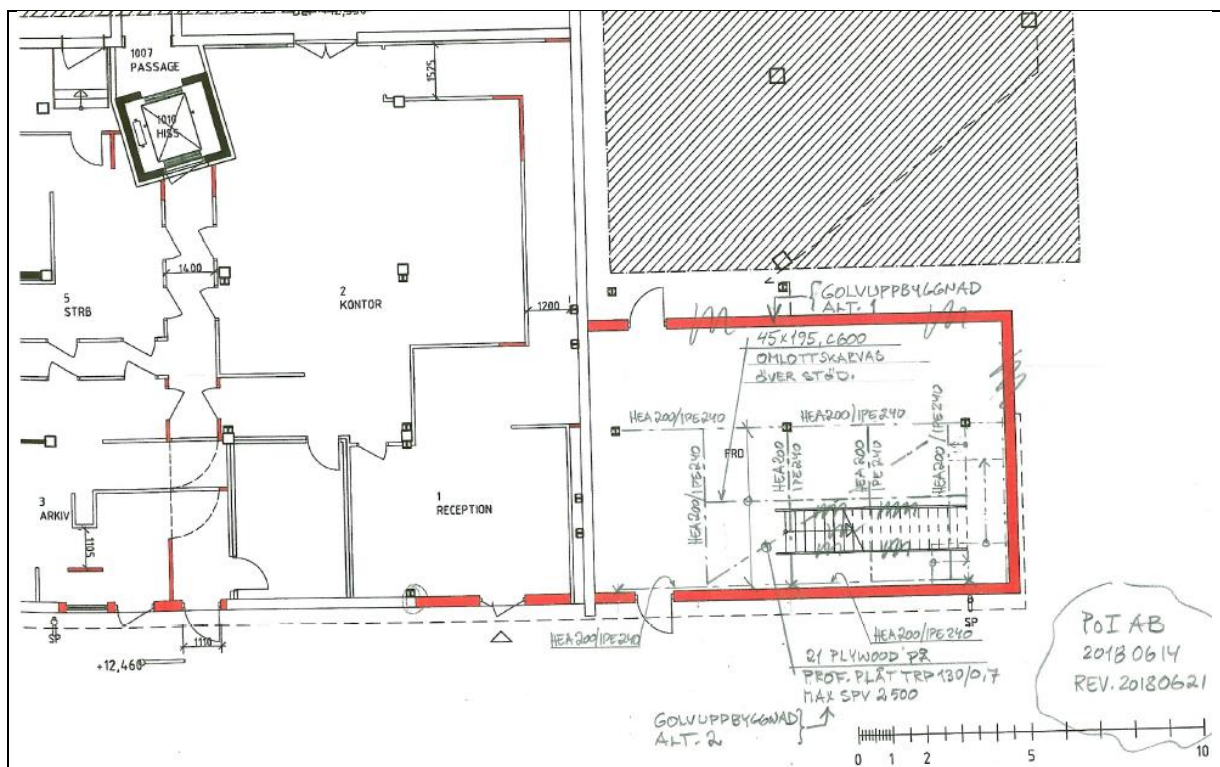

### Versionshantering

Datum	Version	Beskrivning	Ändrat av
2018-06-23	1.0	Nytt förråd öster om Stationsbyggnad Valkyria (i utrymme där köfålla Balder var fram till 2016)	Annika Wilén

**Projektägare**  
Andreas Andersen (VD)


**Styrgrupp**  
Styrgrupp Projekt, (SGP)

## Projektbeskrivning

### Bakgrund

From och med Januari 2019 kommer Trafikverket få nyttjanderätt över del av norra Parken (inom ramen för det avtal som tecknats mellan Liseberg och Trafikverket). Fram till april 2019 kommer Lisebergshallen, Stjärnornas Krog, Green Room, Ateljén, Kaskad, Kaninum, Festvåningen och tillhörande förråd att rivas. Därefter sker anläggningsarbeten för att bygga den nya tunneln. Etapp Korsvägen planeras av vara klar år 2024. Västlänken planeras vara i drift år 2026.

Produktion Västlänken har betydande påverkan på Lisebergs verksamhet. Innan avtalstecknande har parterna reglerat vilka ytor som skall rivas, ersättas och vem som uppför erforderliga ersättningsytor. Gästservice och Rondo kommer att vara kvar. Övriga ytor inom Trafikverkets arbetsområde kommer att rivas.

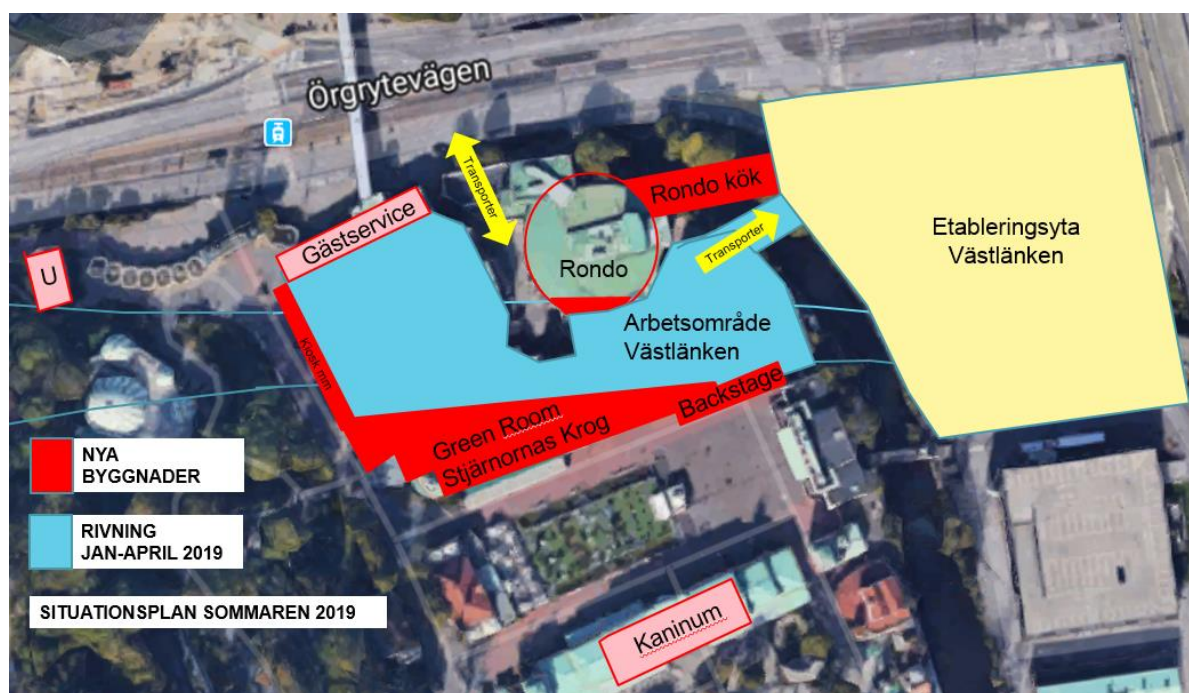

Trafikverket kommer att uppföra en temporär byggnad för Stjärnornas Krog, Green Room med ett avgränsande byggplank innehållande kiosk, lyckohjul mm. Trafikverket kommer också att bygga en brokonstruktion för Rondo Kök inom den Miljödom som finns för arbeten i vatten. Övriga funktioner ansvarar Liseberg för att ersätta.

Produktion Västlänken innebär en rad följdprojekt för Liseberg. Bedömning görs om berörda ytor inom arbetsområdet behöver ersättas, var de lämpligast flyttas och hur övrig parkdrift påverkas. Ambitionen är att i möjligaste mån etablera permanenta lösningar för de verksamheter som skall återskapas. Viktigt i planeringen är också att ta höjd för de ytor som försvinner genom produktion av Jubileumsprojektet De följdprojekt som Liseberg ansvarar för är (nr 1 ansvarar Trafikverket för);

	Projekt	Typ av lösning	Ansvar process	Klart	PL	Unof
1	Stjärnornas Krog, Green Room, byggplank/ kiosk mm	Temporär byggnad (bodlösning)	Planering och produktion av TRV (gm WLC)	Juni 2019	LEH	SGV
2	Ersättningskök Rondo	Temporär byggnad (bodlösning)	Planering och produktion av Liseberg	Januari 2019	JG	SGP
3	Ersättning Backstage Stora Scenen	Temporär byggnad (bodlösning)	Planering och produktion av Liseberg	Januari 2019	LEH	
4	Ersättning Festvåning, AO Underhållning i Spindeln	Temporär lösning (mindre ombyggnad)	Planering och produktion av Liseberg	Januari 2019	LJ	
5	Ersättningsyta AO Underhålln. Rosa Rummet	Temporär lösning	Planering och produktion av Liseberg	Januari 2019	LEH	
6	Ersättningsyta AO Rosa Rummet	Temporär lösning (under rivning LH)	Planering och produktion av Liseberg	Januari 2019	LEH	
7	Ersättningsyta Ateljén	Permanent lösning i Spindeln	Planering och produktion av Liseberg	Januari 2019	LJ	
8	Ersättning Lampförråd (rörverkstad i lampfrd)	Permanent lösning i Station Valkyria	Planering och produktion av Liseberg	Januari 2019	AWE	
9	Ersättningsyta Kaninum	Permanent lösning EVT Värld	Planering och produktion av Liseberg	Januari 2019	LEH	
10	Ersättning Frd mm Motorvägsbron	Temporär lösning (tillfälligt bygglov)	Planering och produktion av Liseberg	Januari 2019	DN	

Detta beslutsunderlag är en effekt av att Ateljén rivs. Ateljén måste finnas i nära anslutning till parken och kommer att flyttas till nuvarande Rörverkstad i Spindeln. Läget kommer att ge bra synergier genom närhet till intilliggande verkstadslokaler.

Rörverkstaden kommer att flytta in i nuvarande Lampförråd (i samma våningsplan). Bedömningen är att den verksamheten kommer att fungera väl i något mindre lokaler. Lampförrådet, som denna investering avser, föreslås flyttas till Valkyrias stationsbyggnad i ny tillbyggnad under tågverkstaden (del av yta som utgjorde Balders köfålla). AO Attraktion bedömer att den ytan inte behövs om/när kåfållan flyttar tillbaka. Det begränsar inte heller kön för Zombie enligt Konstnärlig Ledning.

Lampförrådet uppförs som ett kallförråd i 2 våningar (den höga rumsytan medger det). Läget är nära Teknikhuset för de medarbetare som har sin hemvist där. Ytan ligger också nära parken vilket är helt avgörande för att belysningen skall vara tillfredsställande i parken.

**Kostnader**

Bedömd kostnad för ntillbyggnad av ett nytt lampförråd (cirka 60 kvm/plan) är 1 500 000 kr.

**Tider för investeringsbeslut**

Styrelsen skall genom detta beslutsunderlag vid Styrelsemötet 2018-06-25 formellt fatta beslut avseende investering för planering och produktion av ett nytt Lampförråd. Investeringen är en effekt av produktion Västlänken och kommer att belasta 2019 års investeringsram.

**Projektplan**

Projektet skall vara färdigställd senast Q 1 2019.

**Risk**

Inga identifierade risker.

**Protokollförd beviljning**

Vid Lisebergs styrelsemöte 2018-06-25

//Andreas Andersen
